

八八(莫拉克)風災專案進度說明

中華民國紅十字會總會

106年6月30日

背景說明	98年8月8日莫拉克颱風挾帶超大豪雨重創南台灣，造成高雄縣、屏東縣、台東縣、嘉義縣、台南縣、南投縣等地洪水及土石流等嚴重災情。根據行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會資料顯示，總計造成死亡及失蹤 699 人，重傷 4 人，房屋毀損不堪居住 1,766 戶，受災人數共計 51 萬 668 人。			
經費來源	本會自 98 年 8 月 8 日發起勸募，截至 105 年 6 月 30 日止募得現金捐款及物資捐贈計新台幣 49 億 6,678 萬 7,398 元，加計利息收入 7,603 萬 230 元、本會協助政府執行房舍公共工程並申請政府歸墊之收入 3 億 4,020 萬 9,934 元、以及其他收入 598 萬 1,916 元，總計 53 億 8,900 萬 9,478 元。			
計畫與預算	計畫項目		匡列經費(備註1)	百分比
	1.緊急救援與臨時安置		1 億 3,177 萬 2,365 元	2.55%
	2.硬體重建		44 億 7,769 萬 2,293 元	86.63%
	3.軟體重建		4 億 8,249 萬 9,147 元	9.33%
	4.綜合業務-行政費		6,982 萬 5,703 元	1.35%
	5.綜合業務-募款成本		708 萬 2,568 元	0.14%
總計		51 億 6,887 萬 2,076 元	100.00%	
計畫時程	<p>1、本專案辦理期程自 98 年 8 月 8 日災難發生起迄今，其中緊急救援階段、收容安置所之各項服務已執行完畢；至於硬體重建計畫、軟體重建計畫中之部分項目經 105 年 3 月 2 日第 20 屆第 11 次理事會議審議通過展延至 105 年 6 月 30 日，同時函報主管機關行政院衛生福利部。</p> <p>2、本案截至 105 年 6 月 30 日止收支執行報告、賸餘款使用計畫等事項，均經本會 105 年 6 月 21 日第 21 屆第 1 次理事會通過。「八八水災重建計畫賸餘款使用計畫」於 105 年 8 月 1 日以賑字第 1050001997 號函提報衛生福利部，衛福部於 105 年 8 月 29 日以衛部救字第 1050020815 號函覆同意辦理，「八八水災重建計畫賸餘款使用計畫」(預算 2 億 2,013 萬 7,402 元)相關事項詳如後附說明 (P10-P11)。</p>			
執行成果	項目	具體內容	工作執行率	執行進度說明及經費支用情形
	緊急救援與臨時安置	搜救與直昇機後送協助 發送緊急救援物資 發放急難救助金 營區和組合屋收容安置所服務	100.00%	1. 發放 7,704 人急難救助金。 2. 提供營區逾 2,700 人之收容安置服務。 3. 經費支出計新台幣 1 億 3,177 萬 2,365 元。
	硬體重建	臨時住屋計畫： 興建臨時安置收容村民之住所 或臨時學校組合屋共 398 戶	100.00%	1. 包括居住用之組合屋以及臨時教室及臨時辦公廳舍等，已全數完工。

	(間)。		<ol style="list-style-type: none"> 2. 協助嘉義、高雄及屏東組合屋安置，計 256 戶住民、逾 800 人。 3. 經費支出計新台幣 2 億 5,166 萬 3,032 元。
	<u>永久屋計畫：</u> 認養 17 處永久屋興建基地以及協助村民個別重建，共計規劃興建 1,476 戶永久屋。	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永久屋已完成 1,476 戶(含永久屋基地 1,378 戶及自力造屋 98 戶)。 2. 自力造屋部分，核定補助施作 99 戶(高雄 93 戶、嘉義 6 戶)，嘉義縣 6 戶及高雄市六龜區 1 戶分於 101、102 年間陸續先行完工，高雄市那瑪夏區 87 戶則分於 103 至 104 年 6 月接續完工、高雄市桃源區 4 戶 104 年 6 月完工，自力造屋全案總計完成 98 戶。 3. 經費支出計新台幣 37 億 8,422 萬 58 元。
	<u>學校重建計畫：</u> 學校重建 6 所 學校修繕 9 所	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 南投縣信義鄉隆華國小已於 102 年 7 月 5 日落成啟用。 2. 高雄市六龜區龍興國小於 102 年 4 月 20 日完工啟用。杉林區杉林國中於 102 年 11 月 2 日舉行落成啟用。桃源區建山國小於 103 年 6 月完工，並於 11 月 6 日辦理落成啟用典禮。 3. 第 20 屆第 2 次理事會議通過繼續援建高雄市桃源區樟山國小及甲仙區甲仙國中，兩校均已於 104 年 12 月 4 日上、下午分別辦理落成啟用典禮。 4. 補助修繕南投縣信義鄉雙龍國小、嘉義縣新港鄉文昌國小、義竹鄉南興國小、溪口鄉溪口國中、溪口鄉柴林國

			<p>小、溪口鄉柳溝國小、東石鄉港墘國小、台南市七股區光復國小、高雄市大社區嘉誠國小等 9 校。</p> <p>5.經費支出計新台幣 3 億 4,509 萬 5,330 元。</p>
		<p><u>公共設施計畫：</u> 吊橋 2 座</p>	<p>100.00%</p> <p>1. 嘉義縣福美吊橋已於 100 年 9 月底完工。</p> <p>2. 第 20 屆第 2 次理事會議通過再援建屏東縣三地門吊橋，於 104 年 12 月 26 日辦理通橋啟用典禮；復於 105 年 3 月 1 日至 4 月 15 日封橋階段進行全面巡檢查修，並於 4 月 11 日邀請屏東縣府派員完成巡檢查驗，同時點交縣府正式接管。</p> <p>3. 經費支出計新台幣 9,671 萬 3,873 元。</p>
軟體重建	<p><u>社區與生活重建計畫：</u> 結合公益組織夥伴，提供重建區多面向服務，推動社區工作，育成在地組織，建立普及化與社區化的資源服務網絡，協助社區需求獲得滿足。</p>	<p>100.00%</p>	<p>1. 災後第 2 年起，每年以約 20%的進度開展，預定 5 年完成。</p> <p>2. 設置於高雄市、屏東縣、台東縣及南投縣共 8 處社區與生活重建工作站及 2 處支援中心，均在 104 年 6 月任務結束，圓滿撤站。</p> <p>3. 災區 102 個陪伴服務方案，已全數完成。</p> <p>4. 經費支出計新台幣 1 億 8,261 萬 8,192 元。</p>
	<p><u>發展特色學校計畫：</u> 發展重建區特色學校計畫，協助重建區內小學、國中及高中職等學校，發展特色項目，包括永續環境教育、人文藝術教育、體育競技教育、資訊科學教育、國際外語教育及特殊需求教育。</p>	<p>100.00%</p>	<p>1. 102 年 5 月於台中、台南、高雄及台東辦理分區說明會，共 156 所學校申請，98 所提出計畫，經過複審計有 41 案 (53 所學校)計畫入選，各校並成立 53 支紅十字青少年服務隊簡稱紅少服)。</p> <p>2.102 年 10 月辦理紅少服指導</p>


			<p>老師研習。</p> <p>3.103 年 3 月完成水芙蓉計畫第一年執行進度評鑑。</p> <p>4.103 年 4 月辦理水芙蓉計畫特色教學、志願服務實錄微電影拍製研習，7、8 月辦理防災教育月，9 月辦理微電影及防災教育徵文比賽頒獎典禮。</p> <p>5. 103 年 12 月至 104 年 2 月辦理訪評計畫，計 49 校案接受訪評。</p> <p>6. 第 2 年補助計畫已於 104 年 8 月 31 日結束。</p> <p>7.104 年 11 月 20 日舉辦「水芙蓉回顧與展望座談會暨績優學校表揚」活動，計有水芙蓉學校及分會同仁 50 人參加，為期 2 年的水芙蓉特色教學計畫畫下圓滿句點。</p> <p>8.經費支出新台幣 5,063 萬 6,853 元。</p>
		<p><u>生計扶助與改善計畫：</u> 與公益組織夥伴共同協助村民推動生計重建計畫。</p>	<p>100.00%</p> <p>1. 於嘉義縣、高雄市、屏東縣及台東縣支持 9 案在地的生計方案，已全數完成。</p> <p>2. 莫拉克重建會轉介躍動計畫 4 案已完成。</p> <p>3. 經費支出計新台幣 2,217 萬 7,010 元。</p>
		<p><u>永續山林計畫：</u> 為因應氣候變遷人道救援之新挑戰兼及永續山林理念，本會與農委會協助受災縣市內 200 公頃土地造林防災，協助災區生計、環境保育之永續發展。</p>	<p>100.00%</p> <p>1. 本會與農委會共同合作，環境品質文教基金會承辦，進行撫育造林防災。</p> <p>2. 農委會林務局提供土地 200.1272 公頃，可施作 175.1272 公頃，實際施作 174.418 公頃，共 8 處林地：高雄桃源荖濃溪第 56 林班、臺東關山第 19 林班、高雄寶來旗山第 66 林班、</p>

				<p>臺東關山第 20 林班、高雄小林村五里埔旗山第 7 林班、嘉義阿里山第 9 林班、嘉義大埔第 37 林班、台南玉井第 70 林班；已全數完成。</p> <p>3. 經費支出計新台幣 4,259 萬 1,493 元。</p>
		<p><u>強化備災與救災能量計畫：</u> 配合政府進行災時避難所及備災中心整修計畫，積極為下一次的災難預作準備，儲備救災能量。</p>	<p>100.00%</p>	<p>1. 已於八八水災重建地區完成 19 處小型備災倉庫，包括南投縣 7 處、嘉義縣 3 處、高雄市 7 處、屏東縣 1 處及台東縣 1 處。</p> <p>2. 本會與高雄市政府合作於牛稠埔營區興建可臨時收容避難災民 368 人之臨時避難所，已於 100 年 12 月 18 日辦理揭牌儀式，正式啟用。</p> <p>3. 推動自主防災社區計畫，已於新竹縣、苗栗縣、南投縣、高雄市、屏東縣及台東縣等 11 社區完成社區防災工作的宣導、訓練及演練。</p> <p>4. 籌建嘉義縣及台東縣備災中心，強化當地防災能量，台東備災中心已於 105 年 5 月 15 日落成啟用。嘉義備災中心原於 104 年 6 月 30 日完成工程發包，惟嘉義備災中心建置預定地因周遭住民陳抗事件紓解無效，另覓該縣水上鄉國有土地重新籌建。</p> <p>5. 提高社區防備災能力，完成「坐博愛座、做博愛人，阿公招阿嬤、作伙來救人」急救訓練計畫，總計辦理 289 場次。</p> <p>6. 經費支出計新台幣 1 億 6,220</p>

				萬 1,249 元。
		急難救助及助學金計畫	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供災區家庭急難救助金，已有 468 案家受益。 2. 99 學年度提供災區山地原住民鄉國中國小清寒學生助學金，補助 29 所學校、受益學生 943 人。 3. 100 學年度提供重建區國中國小清寒學生助學金，補助 100 所學校、受益學生 1,591 人。 4. 101 學年度重建區國中國小清寒學生助學金，補助 96 所學校，受益學生 1,826 人。 5. 102 學年度重建區國中國小清寒學生助學金，補助 91 所學校，受益學生 1,636 人。 6. 103 學年度重建區國中國小清寒學生助學金，補助 58 所學校，受助學生 1,410 名。 7. 經費支出計新台幣 2,227 萬 4,350 元。
	綜合業務：行政費	執行本專案之業務執行費用	100.00%	經費支出計新台幣 6,982 萬 5,703 元。
	綜合業務：募款成本	執行本專案之募款、責信之必要成本。	100.00%	經費支出計新台幣 708 萬 2,568 元
備註	<p>本案至 105 年 6 月 30 日止收支執行報告及八八水災重建計畫贖餘款使用計畫(預算 2 億 2,013 萬 7,402 元)，均經 105 年 6 月 21 日第 21 屆第 1 次理事會通過。「八八水災重建計畫贖餘款使用計畫」於 105 年 8 月 1 日以賑字第 1050001997 號函提報衛生福利部，衛福部於 105 年 8 月 29 日以衛部救字第 1050020815 號函覆同意辦理。</p>			



本會於嘉義縣番路鄉轆子腳基地興建「日安社區」，是本會第一個完工的永久屋社區

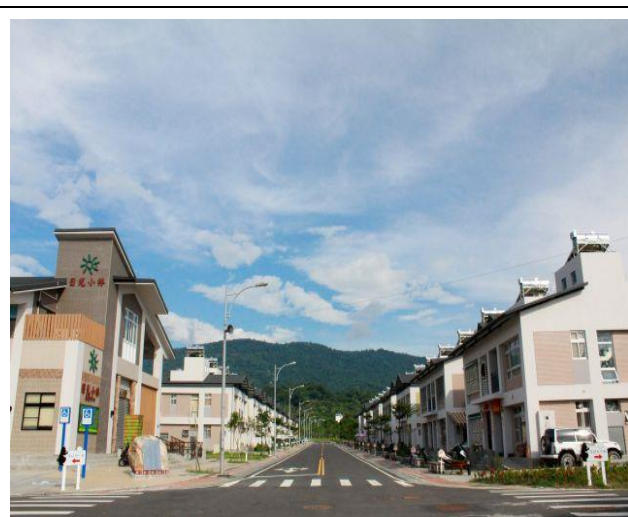

本會於高雄市杉林區興建「日光小林社區」，讓小林村民重新在這兒找回家鄉的感覺



除了永久屋，本會也興建社區內的活動中心、產銷中心等設施，提供居民完善的社區空間



本會援建嘉義縣阿里山鄉福美吊橋，全長 176 公尺，是一座相當美的垂索式吊橋



本會補助茶山雜糧產銷班小米收成，大家好開心



本會協助原鄉居民組成志工隊伍並進行訓練



本會協助興建高雄市龍興國小，好漂亮的校舍



高雄市杉林國小融入創新的鼓術教學



本會在吾拉魯滋部落推行老幼共學，透過日間關懷透過活動讓長者與稚兒更加親近，帶入年輕活力，傳承生命經驗與智慧



本會在屏東永久屋社區新來義部落推行數位輔導關懷陪伴工作，鼓勵婦女及孩童積極面對數位科技



本會於災區與當地居民共同造林，保育大地母親



本會於重建區辦理排灣族兒童文化列車活動，建立自我文化認同、促進原民文化傳承



本會協助興建高雄市甲仙國中教職員宿舍，讓作育英才的老師們，在學校裡也有個家



本會援建屏東縣三地門鄉山川琉璃吊橋，全長 263.25 公尺，是全國最長且優美的臥床式吊橋



台南市海東國小以特色教學「科學教育」參加全球虛擬教室競賽獲國際金牌獎，榮獲總統召見



「水芙蓉回顧與展望座談會暨績優學校表揚」活動，為期 2 年的特色教學計畫畫下圓滿句點



本會援建高雄市桃源區南橫公路上最偏遠之樟山國小，距左營高鐵還要 2 個半小時的車程



本會首次建置自有之台東備災中心

八八水災重建計畫贖餘款使用計畫相關事項如下：

- 1、八八水災重建計畫至 105 年 6 月 30 日止贖餘 2 億 2,013 萬 7,402 元，本會擬具「八八水災重建計畫贖餘款使用計畫」，經本會 105 年 6 月 21 日第 21 屆第 1 次理事會通過後，於 105 年 8 月 1 日以賑字第 1050001997 號函提報衛生福利部，衛福部 105 年 8 月 29 日衛部救字第 1050020815 號函覆同意辦理。執行期限至 108 年 6 月 30 日止。
- 2、105 年 7 月至 106 年 6 月 30 日止共收入新台幣 174 萬 8,972 元 (含捐款收入 4,000 元、利息收入 171 萬 5,829 元,其他收入 2 萬 9,143 元)，加計贖餘款 2 億 2,013 萬 7,402 元，合計 2 億 2,188 萬 6,374 元，支出數 1,613 萬 8,078 元，使用率 7.33%。
- 3、八八水災重建計畫贖餘款使用計畫計分五項次、預算額度及執行成果分別說明如下：

計畫與預算	計畫項目		匡列經費	百分比
	1.大台北備災中心		1 億 5,700 萬 4,595 元	71.32%
	2.嘉義備災中心		2,500 萬元	11.36%
	3 花蓮備災中心		2,500 萬元	11.36%
	4.土地租金		883 萬 2,807 元	4.01%
	5.綜合作業費		430 萬元	1.95%
	總計		2 億 2,013 萬 7,402 元	100.00%

執行成果	項目	具體內容	工作執行率	執行進度說明及經費支用情形
	大台北備災中心	配合政府進行災時避難所及備災中心建置計畫，積極為下一次的災難預作準備，儲備救災能量。	0.47%	1、105 年 5 月 24 日與財政部國有財產署簽訂淡水區望高樓段 598 號地號等 19 筆國有土地租賃契約作為建置基地，期內除已辦理二次佔用人地上佔用物協調遷移外，於 9 月 23 日配合地政機關及測量公司進行基地鑑界釘界樁相關事宜；規劃設計建築師招標已於 9 月 13 日公告，並於 10 月 13 日評選詹勳次建築師為優勝廠商；再向理監事完成規劃提報、刻依理監事建議修正事項進行初步規劃中，工程建置基地土地已完成測量鑑界、至地質鑽探分析已於 106 年 1 月底前完成，數據提

			<p>供建築師細部設計運用。原規劃設計備災中心及會所各乙棟建物擬案，因故合併為乙棟建物，於 106 年 2 月 15 日提送第 21 屆理事會大台北備災中心推動小組審議備查，刻由建築師重新辦理初步規劃設計，預於 106 年 4 月 25 日提送推動小組會議同意後，再依預劃期程進行後續事宜。</p> <p>2、106 年 3 月底與詹勳次建築師事務所修訂服務契約書後，分於同年 4 月 5 日、4 月 25 日、5 月 10 日、5 月 17 日召開功能需求及規劃設計說明會；6 月 15 日復再向 21 屆理事會大台北備災中心推動小組報告細設進度。</p> <p>3、簡易圍籬工程已於 106 年 6 月 23 日進場施作，預計同年 7 月 5 日完成施作。</p> <p>4、經費支出計新台幣 73 萬 8,051 元。</p>
嘉義備災中心	配合政府進行災時避難所及備災中心建置計畫，積極為下一次的災難預作準備，儲備救災能量。	42.74%	<p>1、105 年 9 月 6 日建築師完成第二次初規提報，復經嘉義縣支會確認符合需求；基地地質鑽探及測量、鑑界事宜分於 105 年 8 月 23、31 日完成；已於 105 年 11 月 25 日取得建照執照、同年 12 月 20 日完成工程發包、同年 12 月 30 日整地開工、106 年 1 月 6 日舉行動土開工典禮，預期 106 年 9 月份竣工。</p> <p>2、已完成結構體及輕質牆組立、刻進行內外牆批土粉刷、水電管線及內裝施作、工程進度近 82%。</p> <p>3、經費支出計新台幣 1,068 萬 4,620 元。</p>

花蓮備災中心	配合政府進行災時避難所及備災中心建置計畫，積極為下一次的災難預作準備，儲備救災能量。	0.97%	<p>1、已完成李育聰建築師遴選。106年3月2日核定該中心初步規劃擬案，同年3月28日將土地租賃契約書函送國有財產署核印簽訂租約，同年4月20日國產署核發土地租賃契約書及土地使用同意書、廠商始進場進行地質鑽探、測量事宜，建築師復依據鑽探所得地質數據持續進行細部設計；6月8日建造執照申請書送花蓮縣建築師公會，13日排定審查，惟因土地尚未完成分割及登記事宜，待土地分割登記完成，期7月中旬前取得建照。</p> <p>2、工程招標公告於106年6月19日至29日於總會、營建院、台灣採購公報網及台灣區綜合營造業同業公會公告邀標，惟迄截標時止無廠商投標；復於同年7月3至10日起仍於前述官網進行第二次公告招標事宜。</p> <p>3、經費支出計新台幣24萬2,596元。</p>
土地租金	各備災中心建置基地均係向財政部國有財產署所承租，依法配合向政府繳納土地租金	14.13%	<p>1、依法繳納大台北、嘉義、花蓮等備災中心使用土地租金。</p> <p>2、經費支出計新台幣124萬8,156元。</p>
綜合作業費	執行本專案之業務執行費及責信之必要成本等	74.99%	經費支出計新台幣322萬4,655元。



大台北備災中心規劃設計優勝廠商作品



大台北備災中心地質鑽探土壤取樣圖



大台北備災中心變更規劃設計透視圖(1)



大台北備災中心圍籬網設置紅十字會宗旨標示牌



大台北備災中心變更規劃設計透視圖(2)



大台北備災中心簡易圍籬設置工程



嘉義備災中心動土開工典禮



嘉義備災中心動土開工典禮



嘉義備災中心外牆塗料施作



嘉義備災中心超耐磨地坪收尾



嘉義備災中心外觀



嘉義備災中心內賑濟物資貨架



花蓮備災中心正面立面圖



花蓮備災中心背面立面圖
