

# 尼泊爾地震專案進度說明

中華民國紅十字會總會

106年12月31日

背景說明	<p>台北時間 104 年 4 月 25 日下午 2 點 11 分，尼泊爾首都加德滿都西北 77 公里處，發生規模 7.8 的強震，據紅十字會暨紅新月會國際聯合會(下稱國際聯合會)，104 年 6 月 6 日「尼泊爾地震緊急聲援行動第 4 號更新報告」，造成 8,633 人死亡、85 萬 747 戶房屋毀損、受影響家庭 112 萬 6,422 戶，流離失所家庭 65 萬 1,675 戶，受損學校 4,085 棟，災情慘重，迫切需要緊急救援、災後復原重建的相關援助。</p>		
經費來源	<p>本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日發起勸募，至 104 年 7 月 31 日勸募活動結束止，目標為新台幣(下同)4,000 萬元。截至 106 年 12 月 31 日止捐款收入累計 4,252 萬 909 元，加計利息收入 5 萬 2,536 元，合計 4,257 萬 3,445 元。</p>		
計畫與預算	計畫項目	匡列經費 (註 1)	百分比
	1. 緊急賑濟	778 萬 3,722 元	18.29%
	2. 協助災區中長程之復原重建工作	3,248 萬 7,532 元	76.31%
	3. 勸募成本	2 萬 6,043 元	0.06%
	4. 綜合業務費	227 萬 4,787 元	5.34%
總計	4,257 萬 2,084 元	100.00%	
計畫期程	<p>1. 本專案辦理期程自 104 年 4 月 26 日災難發生起，原規劃至 106 年 4 月 25 日止，為期 2 年，然因國際聯合會規劃自 105 年 2 月開始執行耐久屋的建置，因尼泊爾社經情勢複雜，直至同年 9 月才展開工作，本案執行期程延至 107 年 6 月 30 日止。另本會捐款依國際聯合會原先規劃每戶援建金額 20 萬元尼幣(約 2,000 美元)可援建 280 戶，因尼國政府將每戶援建金額提高為 30 萬元尼幣(約 3,000 美元)，本會援建戶下修為 268 戶。前開展延及下修援建戶數量，已於 106 年 12 月 12 日第 21 屆第 5 次理監事會議中提報。</p> <p>2. 目前緊急賑濟階段已經執行完畢，刻進行中長程之復原重建階段。</p>		

	項目	具體內容	工作執行率	進度說明與經費支出
執行成果	1.緊急賑濟	<p>1、本會自 104 年 4 月 28 日起，先後派遣 4 梯計 12 人次前往尼泊爾，單獨或與其他 NGO、尼泊爾紅會評估災情並陸續分別到 Kathmandu Valley、Sindhupalchowk、Nuwakot、Gorkha、Sinduli、Charikot 以及 Dhading 等重災區之社區、農村、山區、學校、孤兒院等，發送帳篷、睡袋、毛毯、發電機、嬰幼兒奶粉、防水布、礦泉水、泡麵、白米、食物包(包括米、糖、鹽、油)及蚊帳等物資。</p> <p>2、同時在加德滿都的「受剝削婦女及兒童生活支持中心」的孤兒院，提供帳篷及衛生用品，並補助興建廁所，以維護公共衛生。</p>	100%	<p>1、響應國際聯合會捐助美金 3 萬元，用於緊急賑濟。</p> <p>2、緊急賑濟階段先調用本會各備災中心物資。目前已完成 450 頂帳篷及 480 件睡袋完成回補，及 1,060 條毛毯已完成驗收並回補。</p> <p>3、經費支出計新台幣 778 萬 3,722 元。</p>
	2.中長程之復原重建	<p>1、本會已於 104 年 12 月 21 日與國際聯合會簽訂捐款承諾書，104 年 12 月 24 日捐贈國際聯合會美金 94 萬 2,042 元，於尼國新都里(Sindhuli)地區援建 265 戶耐久屋。105 年 8 月 18 日，因尼泊爾震災加計利息收入尚有餘款，為擴大協助尼泊爾地震災民，以現有餘款再加上本會自籌款(國際賑濟)新台幣 7 萬 5,369 元，計新台幣</p>	100%	<p>1、依照國際聯合會的復原計畫，運用各國的捐款在新都里地區建造 880 戶耐久屋(含本會援助 268 戶)。自 105 年 2 月起區分評估、協建訓練、興建樣品屋、建造工程及責信報告等 5 階段執行，至 106 年 12 月新都里地區已有 420 戶完成建造。本案預定</p>

		<p>167 萬 7,561 元合美金 53,400 元，再度援建 15 戶耐久屋。合計本會援建耐久屋達 280 戶。</p> <p>2、106 年 8 月 29 日至 9 月 3 日李夢君副處長率高寯柏資專至尼泊爾新都里地區訪視，拜會 IFRC 辦公室及尼泊爾紅會並至新都里地區實地訪視耐久屋建造情形，計訪視 3 個村落 6 戶已完成建造之耐久屋。</p>		<p>於 107 年 6 月底前完成，國際聯合會將於完成後，提供本會所援建 268 戶耐久屋受益人資料，作為本會責信依據。</p> <p>2、尼泊爾滿願寺佛堂提供加德滿都地區人道與宗教活動使用，為宏揚本會博愛與人道精神，援助該寺修繕受震災毀損之住宿及修行大樓。 104 年 12 月 22 日先行撥付一半款項(美金 5 千元)，修繕工程於 105 年 7 月完成，尾款美金 5,000 元於 105 年 9 月 7 日支付完畢。</p> <p>3、經費支出計新台幣 3,248 萬 7,532 元。</p>
	3.勸募成本	募款及責信之必要成本支出	100%	經費支出計新台幣 2 萬 6,043 元
	4.綜合業務	執行本專案工作之業務執行費	81.82%	經費支出計新台幣 186 萬 1,165 元。
備註	<p>1. 本專案原列預算新台幣 4,000 萬元，業經本會 106 年 5 月 10 日第 21 屆第 2 次臨時理事會議通過，調整後總預算為 4,257 萬 2,084 元。</p> <p>2. 104 年 8 月 25 日衛生福利部函覆本會「425 尼泊爾地震賑濟勸募計畫」勸募成果報告已悉。</p> <p>3. 本專案截至 106 年 12 月 31 日止，累計經費支出新台幣 4,215 萬 8,462 元，占總收入 99.03%。</p>			



高山區紅會搭機來賑濟，小孩破涕為笑



直升機賑濟物資卸載援助山區




圓滿法洲寺雖然也有自己的困難，仍願伸出援手幫助瀕臨絕境的災民



尼泊爾地震後原本三層樓的住宅已成廢墟



王會長與法師們深入尼泊爾災區察看

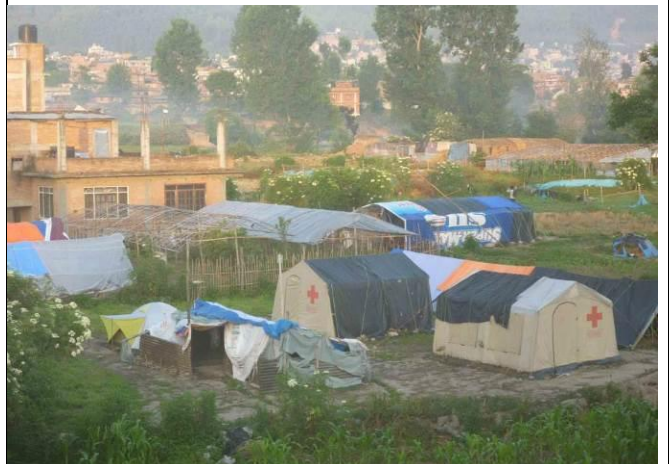

本會捐助帳篷於災區供尼泊爾受災民眾使用



滿願寺整修後修行大樓外觀



滿願寺整修後修行大樓內觀



村民參觀瞭解國際聯合會(IFRC)援建之耐久屋



竣工的耐久屋提供災民安身立命之所



工作人員向災民說明耐久屋之構型設計



為了美好的未來積極展開重建復原工作



同心合力為新屋打造穩固及抗震地基



建造完成後的新屋帶給災民未來的希望



李夢君副處長及高寧柏資專拜會 IFRC 駐尼國辦公室，由該辦公室主任 Juja Kim 女士接待，隨後由 IFRC 各部門實施口頭簡報。



拜會尼國紅會在接待室裡與尼國紅會會長 Sanjiv Thapa 先生及尼國紅會官員合影。



在新都里籌建基地樣品屋前全體合影留念。



在新都里 Sarki 先生新建的耐久屋。



**Thapa** 女士建造的耐久屋，是以傳統尼泊爾房屋格局建造，外觀相當具有當地色彩。



**Babu Thapa** 先生蓋的連棟耐久屋寬敞舒適，再也不用擔心小孩回來沒安全的地方可住。
