菲律賓海燕颱風專案進度說明

中華民國紅十字會總會　　105 年 9 月 30 日

背景說明	102 年 11 月 8 日，菲律賓遭逢颱風襲擊。強烈颱風海燕，以最高風速每小時可達 270 公里的強風，夾帶猛烈雨勢，橫掃菲律賓中部，摧毀了當地約 8 成的土地。依據菲律賓紅十字會表示，風災已造成 6,300 人死亡，上百萬人流離失所。災後宿霧和塔克羅班市等地幾乎夷為平地，居民的生活陷入困境。公共設施如橋樑、道路、通訊設施及電力供應等也遭到嚴重損壞。
經費來源	本專案辦理期程自 102 年 11 月 14 日發起勸募，至 103 年 2 月 14 日勸募活動結束止，截至 105 年 9 月 30 日為止，共募得 3,394 萬 345 元，加計利息收入 18 萬 1,455 元，其他收入 3,213 元，總計 3,412 萬 5,013 元。

計畫與預算

計畫項目	匡列經費 (備註 1)	百分比
1. 緊急救援	420 萬 5,835 元	12.38%
2. 核心住宅	2,745 萬 7,818 元	80.81%
3. 工程管理費	17 萬 2,200 元	0.51%
4. 綜合業務-行政費	206 萬 614 元	6.06%
5. 綜合業務-募款成本	8 萬 386 元	0.24%
總 計	3,397 萬 6,853 元	100.00%

計畫期程	本專案辦理期程自 102 年 11 月 8 日災難發生起，至 105 年 11 月 8 日止，為期 3 年。

執行成果備註

項目	具體內容	工作執行率	進度說明與經費支出
緊急救援	1、緊急空運賑濟物資帳篷 400 頂、毛毯 3,000 件及口糧 8,400 包至宿霧機場，並派員前往宿霧，實地評估待援需求。 2、協調菲律賓紅會，將賑濟物資全數發放至北宿霧之 San Remigio、Daanbantayan 和其他地區。	99.82%	1、賑濟物資已和菲律賓紅十字會合作，全數發放予受災民眾。 2、截至 105 年 9 月 30 日止計支出新台幣 419 萬 8,235 元。

	核心住宅	1、援建目標 250 戶核心住宅，規劃北宿霧 Daanbantayan 鎮 Bagay 及 Tominjao 村計 164 戶，另 86 戶援建卡皮茲省(Capiz) Ivisan 鎮 。 2、104 年 3 月 13 日本會與本會與菲紅會雙方簽訂海燕颱風重建計畫協議書，同意支援菲幣 37,042,972 比索於菲律賓宿霧省及卡皮茲省實施援建 250 戶核心住宅(core shelter)計畫，完工時程 104 年 12 月 31 日。。 3. 105 年 3 月 15 日本會與菲紅會雙方簽訂海燕颱風重建計畫協議書第一次修訂，支援菲幣 37,042,972 比索於菲律賓宿霧省及卡皮茲省實施援建 250 戶核心住宅計畫，完工時程延至 105 年 6 月 30 日。 4. 105 年 9 月 21 日本會與菲紅會雙方簽訂海燕颱風重建計畫協議書第二次修訂，預算不變，完工時程延至 105 年 9 月 30 日。	84.80%	1、截至 105 年 9 月 30 日，本會援建核心住宅 250 戶(卡皮茲省 86 戶、宿霧省 164 戶)，卡皮茲省 86 戶已全部完工；宿霧完成 126 戶，計完成 212 戶，2 戶興建中，完成率 84.8%，目前因雨季、颱風、菲紅會總部撥款、供應商供貨品質及政治不穩定等因素，工程稍有延誤，預計核心住宅工程將於 105 年 11 月底完工。 2、截至 105 年 9 月 30 日止計支出新台幣 2,632 萬 6,675 元。
	工程管理費	核心住宅建造進度尚未達台灣營建院工程管理監督階段	0%	建造進度尚未達台灣營建院工程管理監督階段。

	綜合業務--行政費	1、103 年 2 月 11 日至 14 日前往菲律賓馬尼拉參加 IFRC、ICRC 及菲律賓紅十字會聯合辦理之高峰會議，討論海燕風災賑濟行動運作模式，並與菲律賓紅十字會達成共識，決定援建房屋。 2、103 年 6 月 3 至 8 日赴馬尼拉、Daanbantayan 及 Tacloban 等地，現勘及協調本會海燕專案援建 core shelter 事務。 3、103 年 7 月 22 日至 25 日赴菲律賓馬尼拉及北宿霧 Daanbantayan 等地，實施海燕專案援建協調。 4、房舍援建計畫部分： 103 年 8 月 28 日與菲紅會簽訂海燕風災合作備忘錄。103 年 8 月 28 日本會與菲紅會簽訂海燕風災意向書。 5、103 年 9 月 23 日開始視任務狀況，實施菲律賓海燕颱風專案派駐偕同菲律賓紅會一起實施評估及協助援建事宜。	50.45%	截至 105 年 9 月 30 日止計支出新台幣 103 萬 9,517 元。
	綜合業務-募款成本	執行本專案募款手續費及責信等相關費用	100.00%	截至 105 年 9 月 30 日止計支出新台幣 8 萬 386 元。
	1. 本專案預算總計 3,397 萬 6,853 元，業經本會 103 年 9 月 10 日第 20 屆第 7 次理事會議通過，新增款項及利息，將以專戶儲存專款專用。 2. 本專案截至 105 年 9 月 30 日止，累計經費支出新台幣 3,164 萬 4,813 元，總支出佔總預算比率為 93.14%。			

本會人員於馬尼拉參加紅十字運動協調會

本會援建北宿霧核心住宅

本會援建卡皮茲省核心住宅	本會援建北宿霧核心住宅
本會援建北宿霧核心住宅	核心住宅構造圖
本會人員向卡皮茲省村民說明核心住宅興建工程期間安全及配合事項	卡皮茲省 Agustin Navarra 村前張貼本會援建核心住宅大型海報

本會人員在卡皮茲省 Agustin Navarra 村參加居民家戶座談	卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心住宅
本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅	本會人員在卡皮茲省訪視援建核心住宅

卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心住宅	卡皮茲省 Agustin Navarra 村本會援建核心住宅

	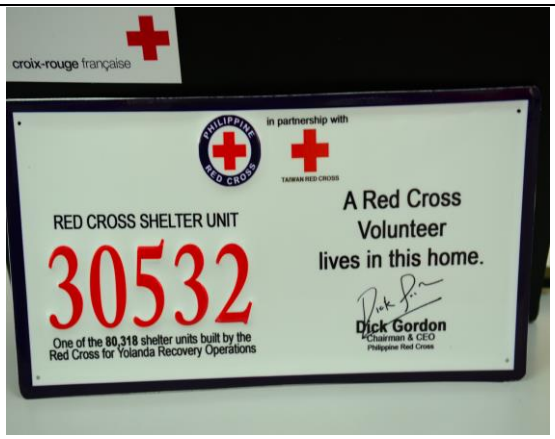
本會援建菲律賓核心住宅受益戶住屋憑證	本會援建菲律賓核心住宅受益戶門牌
