

# 八八(莫拉克)風災專案進度說明

中華民國紅十字會總會

104年12月31日

背景說明	98年8月8日莫拉克颱風挾帶超大豪雨重創南台灣，造成高雄縣、屏東縣、台東縣、嘉義縣、台南縣、南投縣等地洪水及土石流等嚴重災情。根據行政院莫拉克颱風災後重建推動委員會資料顯示，總計造成死亡及失蹤699人，重傷4人，房屋毀損不堪居住1,766戶，受災人數共計51萬668人。			
經費來源	本會自98年8月8日發起勸募，截至104年12月31日止募得現金捐款及物資捐贈計新台幣49億6,678萬7,398元，加計利息收入7,515萬7,733元、本會協助政府執行房舍公共工程並申請政府歸墊之收入3億4,020萬9,934元、以及其他收入288萬1,416元，總計53億8,503萬6,481元。			
計畫與預算	計畫項目		匡列經費(備註1)	百分比
	1.緊急救援與臨時安置		1億3,169萬9,489元	2.47%
	2.硬體重建		44億8,195萬2,106元	84.04%
	3.軟體重建		6億4,977萬2,448元	12.18%
	4.綜合業務		7,000萬元	1.31%
總計		53億3,342萬4,043元	100.00%	
計畫時程	本專案辦理期程自98年8月8日災難發生起迄今，其中緊急救援階段、收容安置所之各項服務已執行完畢；硬體重建計畫、軟體重建計畫已接近尾聲。			
執行成果	項目	具體內容	工作執行率	執行進度說明及經費支用情形
	緊急救援與臨時安置	搜救與直昇機後送協助 發送緊急救援物資 發放急難救助金 營區和組合屋收容安置所服務	100%	1. 發放7,704人急難救助金。 2. 提供營區逾2,700人之收容安置服務。 3. 經費支出計新台幣1億3,177萬2,365元。
	硬體重建	臨時住屋計畫： 興建臨時安置收容村民之住所或臨時學校組合屋共398戶(間)	100%	1. 包括居住用之組合屋以及臨時教室及臨時辦公廳舍等，已全數完工。 2. 協助嘉義、高雄及屏東組合屋安置，計256戶住民、逾800人。 3. 經費支出計新台幣2億5,166萬3,032元。
		認養17處永久屋興建基地以及協助村民個別重建，共計規劃	100%	1. 永久屋已完成1,476戶(含永久屋基地1,378戶及自力造

	<p>永久屋計畫： 興建 1,476 戶永久屋。</p>		<p>屋 98 戶)</p> <p>2. 自力造屋部分，核定補助施作 99 戶（高雄 93 戶、嘉義 6 戶），嘉義縣 6 戶及高雄市六龜區 1 戶分於 101、102 年間陸續先行完工，高雄市那瑪夏區 87 戶則分於 103 至 104 年 6 月接續完工、高雄市桃源區 4 戶 104 年 6 月完工，自力造屋全案總計完成 98 戶。</p> <p>3. 目前經費支出計新台幣 37 億 8,535 萬 6,579 元。</p>
	<p>學校重建計畫： 學校重建 6 所 學校修繕 9 所</p>	<p>100%</p>	<p>1. 南投縣信義鄉隆華國小已於 102 年 7 月 5 日落成啟用。</p> <p>2. 高雄市六龜區龍興國小於 102 年 4 月 20 日完工啟用。杉林區杉林國中於 102 年 11 月 2 日舉行落成啟用。桃源區建山國小於 103 年 6 月完工，並於 11 月 6 日辦理落成啟用典禮。</p> <p>3. 第 20 屆第 2 次理事會議通過繼續援建高雄市桃源區樟山國小及甲仙區甲仙國中，兩校均已於 104 年 12 月 4 日上午、下午分別辦理落成啟用典禮。</p> <p>4. 補助修繕南投縣信義鄉雙龍國小、嘉義縣新港鄉文昌國小、義竹鄉南興國小、溪口鄉溪口國中、溪口鄉柴林國小、溪口鄉柳溝國小、東石鄉港墘國小、台南市七股區光復國小、高雄市大社區嘉誠國小等 9 校。</p> <p>5. 目前經費支出計新台幣 3 億 4,084 萬 5,890 元。</p>
	<p>公共設施計畫：</p>	<p>100%</p>	<p>1. 嘉義縣福美吊橋已於 100 年</p>

	吊橋 2 座		<p>9 月底完工。</p> <p>2. 第 20 屆第 2 次理事會議通過再援建屏東縣三地門吊橋，已於 104 年 12 月 26 日邀請馬總統親臨擔任貴賓辦理通橋啟用典禮。</p> <p>3. 目前經費支出計新台幣 7,480 萬 6,502 元。</p>
軟體重建	<p>社區與生活重建計畫： 結合公益組織夥伴，提供重建區多面向服務，推動社區工作，育成在地組織，建立普及化與社區化的資源服務網絡，協助社區需求獲得滿足。</p>	100%	<p>1. 災後第 2 年起，每年以約 20% 的進度開展，預定 5 年完成。</p> <p>2. 設置於高雄市、屏東縣、台東縣及南投縣共 8 處社區與生活重建工作站及 2 處支援中心，均在 104 年 6 月任務結束，圓滿撤站。</p> <p>3. 災區 102 個陪伴服務方案，已全數完成。</p> <p>4. 目前經費支出計新台幣 1 億 8,277 萬 372 元。</p>
	<p>發展特色學校計畫： 發展重建區特色學校計畫，協助重建區內小學、國中及高中職等學校，發展特色項目，包括永續環境教育、人文藝術教育、體育競技教育、資訊科學教育、國際外語教育及特殊需求教育。</p>	100%	<p>1. 102 年 5 月於台中、台南、高雄及台東辦理分區說明會，共 156 所學校申請，98 所提出計畫，經過複審計有 41 案 (53 所學校) 計畫入選，各校並成立 53 支紅十字青少年服務隊簡稱紅少服)。</p> <p>2. 102 年 10 月辦理紅少服指導老師研習。</p> <p>3. 103 年 3 月完成水芙蓉計畫第一年執行進度評鑑。</p> <p>4. 103 年 4 月辦理水芙蓉計畫特色教學、志願服務實錄微電影拍製研習，7、8 月辦理防災教育月，9 月辦理微電影及防災教育徵文比賽頒獎典禮。</p> <p>5. 103 年 12 月至 104 年 2 月辦理訪評計畫，計 49 校案接受</p>

			<p>訪評。</p> <p>6. 第 2 年補助計畫已於 104 年 8 月 31 日結束。</p> <p>7.104 年 11 月 20 日舉辦「水芙蓉回顧與展望座談會暨績優學校表揚」活動，計有水芙蓉學校及分會同仁 50 人參加，為期 2 年的水芙蓉特色教學計畫畫下圓滿句點。</p> <p>8.目前經費支出新台幣 5,063 萬 6,853 元。</p>
	生計扶助與改善計畫： 與公益組織夥伴共同協助村民推動生計重建計畫。	100%	<p>1. 於嘉義縣、高雄市、屏東縣及台東縣支持 9 案在地的生計方案，已全數完成。</p> <p>2. 莫拉克重建會轉介躍動計畫 4 案已完成。</p> <p>3. 目前經費支出計新台幣 2,217 萬 7,010 元。</p>
	永續山林計畫： 為因應氣候變遷人道救援之新挑戰兼及永續山林理念，本會與農委會協助受災縣市內 200 公頃土地造林防災，協助災區生計、環境保育之永續發展。	100%	<p>1. 本會與農委會共同合作，環境品質文教基金會承辦，進行撫育造林防災。</p> <p>2. 農委會林務局提供土地 200.1272 公頃，可施作 175.1272 公頃，實際施作 174.418 公頃，共 8 處林地：高雄桃源荖濃溪第 56 林班、臺東關山第 19 林班、高雄寶來旗山第 66 林班、臺東關山第 20 林班、高雄小林村五里埔旗山第 7 林班、嘉義阿里山第 9 林班、嘉義大埔第 37 林班、台南玉井第 70 林班；已全數完成。</p> <p>3. 目前經費支出計新台幣 4,299 萬 7,590 元。</p>
	強化備災與救災能量計畫： 配合政府進行災時避難所及備災中心整修計畫，積極為下一	80%	<p>1. 已於八八水災重建地區完成 19 處小型備災倉庫，包括南投縣 7 處、嘉義縣 3 處、高</p>

	<p>次的災難預作準備，儲備救災能量。</p>		<p>雄市 7 處、屏東縣 1 處及台東縣 1 處。</p> <p>2. 本會與高雄市政府合作於牛稠埔營區興建可臨時收容避難災民 368 人之臨時避難所，已於 100 年 12 月 18 日辦理揭牌儀式，正式啟用。</p> <p>3. 推動自主防災社區計畫，已於新竹縣、苗栗縣、南投縣、高雄市、屏東縣及台東縣等 11 社區完成社區防災工作的宣導、訓練及演練。</p> <p>4. 籌建嘉義縣及台東縣備災中心，強化當地防災能量，已完成建築師遴選及規畫設計作業，其中嘉義備災中心已於 104 年 6 月 30 日完成工程發包，台東備災中心於 7 月 15 日完成發包作業。兩案暫定於 105 年 2 月完工。大台北區備災中心正積極籌畫中。惟嘉義備災中心建置預定地因周遭住民陳抗事件紓解無效，旋放棄嘉義縣府預訂地建置改尋覓國有土地重新規劃中。</p> <p>5. 提高社區防備災能力，完成「坐博愛座、做博愛人，阿公招阿嬤、作伙來救人」急救訓練計畫，總計辦理 289 場次。</p> <p>6. 目前經費支出計新台幣 1 億 4,671 萬 7,283 元。</p>
	<p>急難救助及助學金計畫</p>	<p>100%</p>	<p>1. 提供災區家庭急難救助金，已有 468 案家受益。</p> <p>2. 99 學年度提供災區山地原住民鄉國中國小清寒學生助學金，補助 29 所學校、受益學生 943 人。</p>

				<p>3. 100 學年度提供重建區國中國小清寒學生助學金，補助 100 所學校、受益學生 1,591 人。</p> <p>4. 101 學年度重建區國中國小清寒學生助學金，補助 96 所學校，受益學生 1,826 人。</p> <p>5. 102 學年度重建區國中國小清寒學生助學金，補助 91 所學校，受益學生 1,636 人。</p> <p>6. 103 學年度重建區國中國小清寒學生助學金，補助 58 所學校，受助學生 1,410 名。</p> <p>7. 目前經費支出計新台幣 2,227 萬 4,350 元。</p>
	綜合業務	募款、責信之必要成本支出，以及執行本專案工作之業務執行費用支出。	91.67%	目前經費支出計新台幣 7,419 萬 2,122 元〈含募款必要成本 708 萬 2,568 元、業務執行支出 6,710 萬 9,554 元〉。
備註	<p>1. 本專案預算總計 53 億 3,342 萬 4,043 元，業經本會 102 年 5 月 9 日第 20 屆第 4 次臨時理事會議通過。新增款項及利息，將以專戶儲存專款專用。</p> <p>2. 本專案截至 12 月 31 日止，累計經費支出新台幣 51 億 2,620 萬 9,948 元，占總經費 96.11%。</p> <p>3. 軟體重建計畫中，包括永續山林與強化備災與救災能量兩項計畫，屬於長期減災、備災準備工作。</p>			



本會於嘉義縣番路鄉轆子腳基地興建「日安社區」，是本會第一個完工的永久屋社區。



本會於高雄市杉林區興建「日光小林社區」，讓小林村民重新在這兒找回家鄉的感覺。



除了永久屋，本會也興建社區內的活動中心、產銷中心等設施，提供居民完善的社區空間。



本會援建嘉義縣阿里山鄉福美吊橋，全長 176 公尺，是一座相當美的垂索式吊橋。



本會補助茶山雜糧產銷班小米收成，大家好開心。



本會協助原鄉居民組成志工隊伍並進行訓練。




本會協助興建高雄市龍興國小，好漂亮的校舍。



高雄市杉林國小融入創新的鼓術教學。



本會在吾拉魯滋部落推行老幼共學，透過日間關懷透過活動讓長者與稚兒更加親近，帶入年輕活力，傳承生命經驗與智慧。

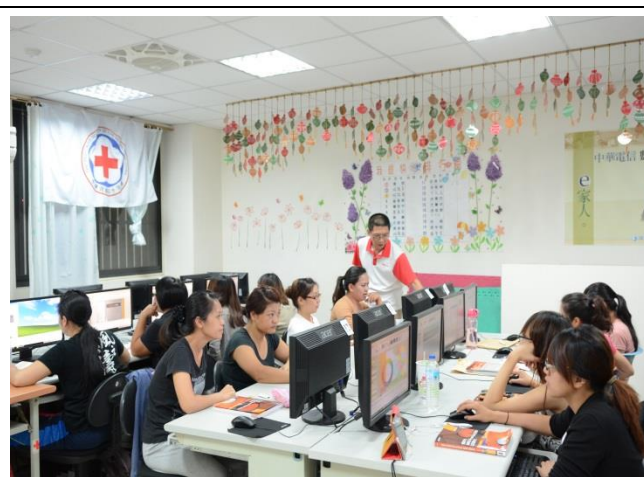

本會在屏東永久屋社區新來義部落推行數位輔導關懷陪伴工作，鼓勵婦女及孩童積極面對數位科技。



本會於災區與當地居民共同造林，保育大地母親。



本會於重建區辦理排灣族兒童文化列車活動，建立自我文化認同、促進原民文化傳承。



本會協助興建高雄市甲仙國中教職員宿舍，讓作育英才的老師們，在學校裡也有個家。



本會援建屏東縣三地門鄉山川琉璃吊橋，全長263.25公尺，是全國最長且優美的臥床式吊橋。



台南市海東國小以特色教學「科學教育」參加全球  
虛擬教室競賽獲國際金牌獎，榮獲總統召見。



「水芙蓉回顧與展望座談會暨績優學校表揚」  
活動，為期2年的特色教學計畫畫下圓滿句點。
