

汶川震災專案進度說明

中華民國紅十字會總會

105 年 3 月 31 日

背景說明	<p>97 年 5 月 12 日中國大陸四川省成都西北方 92 公里處的汶川縣發生相當於芮氏規模 8 地震，四川、甘肅、陝西等地災情嚴重，共計造成近 10 萬人罹難、逾 36 萬多人受傷，緊急遷移與安置人數超過 1,500 萬人，累計受災人數達 4,555 萬人以上。</p> <p>102 年 4 月 20 日四川省雅安市發生芮氏規模 7.0 地震，震央位在雅安市西北方蘆山與寶興縣交界。紅十字會與紅新月會國際聯合會(IFRC)公布消息，造成 186 人死亡、21 人失蹤、1 萬 1,393 人受傷，約計 150 萬人受災。經美國地質勘探局指出，此次地震震央與 97 年汶川地震同屬於龍門山斷層，不排除為汶川地震後之餘震。</p>			
經費來源	<p>本會自 97 年 5 月 13 日發起勸募，募得現金捐款新台幣 15 億 9,338 萬 319 元，加計截至 105 年 3 月 31 日止之利息收入 3,162 萬 2,235 元，合計新台幣 16 億 2,500 萬 2,554 元。而 102 年 4 月 20 日的四川雅安地震，報經內政部同意以同一地區同類災害處理，收到現金捐款新台幣 2,913 萬 5,687 元，加計截至 105 年 3 月 31 日止之利息收入 6 萬 6,879 元，合計新台幣 2,920 萬 2,566 元。專案收入總計新台幣 16 億 5,420 萬 5,120 元。</p>			
計畫與預算	計畫項目	匡列經費	百分比	
	1.緊急救援	3,407 萬 7,770 元	2.06%	
	2.硬體重建	12 億 5,285 萬 9,490 元	75.74%	
	3.軟體重建	2 億 7,483 萬 4,997 元	16.61%	
	4.雅安賑災計畫	6,610 萬 9,755 元	4.00%	
	5.綜合業務-行政費(含雅安)	2,315 萬 2,407 元	1.40%	
	6.綜合業務-募款成本(含雅安)	317 萬 701 元	1.19%	
總計	16 億 5,420 萬 5,120 元	100.00%		
計畫期程	<p>本專案辦理期程自 97 年 5 月 12 日災難發生起，至 103 年 5 月 11 日止，共計 6 年。其中緊急救援階段已執行完畢；硬體重建部分，因為 102 年 4 月雅安發生地震，內政部內受中社字第 1025057736 號函，同意以同類災害處理。</p>			
執行成果	項目	具體內容	工作執行率	執行進度說明及經費支用情形
	緊急救援	<ol style="list-style-type: none"> 1.緊急救助金 2.派遣搜救隊和醫療團 3.緊急救援物資 	100.00%	本項目已執行完畢，經費支出計新台幣 3,407 萬 7,770 元。

硬體 重建	<p>分別在四川、甘肅、陝西援建 43 所學校、43 所衛生院及 1 所殘疾人康復中心，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 四川成都市、雅安市、廣元市、德陽市與阿壩州援建 11 所學校，9 所衛生院，1 所康復中心。 2. 甘肅隴南市西和縣援建 21 所學校，19 所衛生院。 3. 陝西漢中市勉縣援建 11 所學校，15 所衛生院(其中一處為修繕 200 間衛生站)。 	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 硬體工程委請台灣營建研究院全程參與工程設計、施工進度與品質之控管。 2. 總計 87 個項目，已於 100 年 6 月全數完工，87 項目竣工報告，已全數完成審查。 3. 重建完成後，超過 32,648 名學生、超過 150 萬民眾受惠。 4. 經費支出計新台幣 12 億 5,285 萬 9,490 元。
	<p>寒梅計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供受災地區學童生活與教育補助金，以長期補助為原則，保障受災學生繼續就學機會。 2. 與至善社會福利基金會合辦四川茂縣羌族學子助學計畫。 3. 自第 7 期起，除援建學校外，新增重建區 15 所少數民族及 1 所特殊學校。 	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 計畫為期 6 年，分為 12 個學期發放補助金。每學期受理申請後核定撥發。本案已辦理完畢，12 個學期累計受惠學生 1 萬 7,712 人次。 2. 四川茂縣羌族學子助學計畫補助 4 個學期，受助學童 400 人次。 3. 經費支出計新台幣 6,059 萬 3,957 元。
	<p>軟體 重建</p> <p>社區與生活重建計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立社區與生活重建中心、或是透過方案補助方式，以受災社區為基礎，提供兒童、婦女、醫療衛生等服務。為 6 年計畫，預定 103 年完成。 2. 組織援建衛生院院長及學校校長來台交流學習參訪，期使軟硬體發揮加乘效果。 	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本會與「512 台灣川震服務聯盟」在 4 援建地區成立社區與生活重建中心，提供兒童輔導、社區發展、醫療衛生與弱勢關懷等服務，103 年仍有 3 計畫進行中，其中 2 重建中心轉交在地紅十字會持續運作，陝西勉縣社區衛生重建-全科醫學計畫於 103 年 5 月結案。另 24 項陪伴方案 101 年底全部完成。 2. 101 年 3 月及 5 月辦理醫療暨社區參訪團及教育參訪團，邀請 72 位團員來台，增進工作推動及營運管理經驗的交流學習。 3. 101 年 11 月至 103 年 5 月於四川成都西南財經大學辦理社工督導培訓專班，參加學員 48 名。 4. 經費支出計新台幣 4,876 萬 4,857 元。

	<p>弱勢關懷計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 適時針對弱勢族群提供關懷服務。 2. 針對偏遠、貧困或少數民族地區的兒、少、老、婦及低保家庭，提供營養與健康、改善就學、生活條件或增進學習成長服務方案。 	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分送四川省茂縣、汶川縣、雅安市與甘肅西和縣村民 17,325 床冬被。 2. 分送甘肅省西和縣村民 5,000 袋一級麵粉。 3. 提供四川省南江縣 5 部救護車，補充偏遠地區緊急醫療救護所需。 4. 於四川、陝西及甘肅三省重建區，進行 19 項弱勢關懷計畫，內容包含促進營養與健康、改善就學或生活條件及增進學習成長等三方面。102 年 5 月已完成合作備忘錄簽署，開始推動執行。103 年 3 月同意變更 6 案，辦理期程展延至 103 年 12 月 31 日。 5. 運用汶川震災硬體工程結餘款人民幣 513 萬元支持四川省 51 個學校紅色小餐盒計畫及甘肅省 19 個學校弱勢關懷計畫，計有 7,082 位學生受惠。 6. 經費支出計新台幣 8,903 萬 8,156 元。
	<p>備災救災能量加強與推廣： 防災教育宣廣與社區備災、社區備災倉庫與區域及多功能救災備災中心建置、強化物資物流管理系統、救災與重建各類專業人員培訓支持等。</p>	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本項目由大陸紅十字組織蒐整四川省、甘肅省、陝西省提出之備災計畫，總計 77 案，經召開審查小組審議，通過 29 案。102 年 12 月同意變更 9 案，辦理期程展延至 104 年 12 月 30 日。 2. 經費支出計新台幣 6,769 萬 2,639 元。
	<p>陝西省漢中市勉縣在地安寧緩和照顧(含老人照顧)計畫</p>	100.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本會第 20 屆第 5 次理監事聯席會議通過新增計畫，將弱勢關懷計畫因故未實施或不能如期開展項目計人民幣 71 萬 1,000 元，納併安寧緩和照顧計畫執行。 2. 104 年 1 月 30 日至 2 月 2 日本會偕同全國安寧緩和醫學會與護理學會赴當地訓前會商。 3. 104 年 4 月 22 日至 5 月 6 日及 5 月 20 日至 6 月 3 日邀請大陸紅十字組織分別組團勉縣醫護人員來台交流安寧緩和照顧(含老人照顧)，計 41 人參加。 4. 104 年 10 月 15 日上午假福建省福州市辦理「高齡化社會紅十字會的角色與功能」圓桌會議，下午於東南(福建)汽車工業公司舉行捐贈陝西勉縣 10

				<p>輛救護車暨車上救護設備贈車儀式。</p> <p>5. 經費支出計新台幣 874 萬 5,388 元。</p>
雅安賑災計畫	<p>緊急救援行動 (四川雅安)：</p> <p>1. 捐款 100 萬元人民幣，支持 999 緊急救援隊，採購藥品、醫療器械、生活用品及建置流動廁所。</p> <p>2. 派遣評估小組前往雅安勘查災情，評估後緊急調度毛毯 4,527 條、採購帳篷 500 頂，委託華航送往四川成都。</p>	100.00%		<p>經費支出計新台幣 853 萬 7,901 元。</p>
	<p>災後復原重建項目 (四川雅安)：</p> <p>1、 漢源縣九襄鎮第三小學</p> <p>2、 寶興縣明禮鄉中心小學</p>	100.00%	<p>1. 本會已於 103 年 4 月 7 日與大陸紅十字組織簽署海峽兩岸紅十字組織共同參與雅安地震災後重建項目合作備忘錄。</p> <p>2. 大陸紅十字組織於 102 年 9 月下旬提供重建項目，本會同仁於 10 月中旬前往雅安進行協調及訪視。經多次溝通協調，該組織復於 102 年 11 月中旬重新提供援建項目。本會 103 年 1 月 19 日至 27 日再度實地前往雅安瞭解援建情況，並訪視防備災、弱勢關懷與少數民族學校寒梅助學金等項目執行情形。</p> <p>3. 漢源縣九襄鎮第三小學：於 103 年 12 月 31 日完成開標作業，104 年 8 月竣工，9 月投入使用。本會王清峰會長於 9 月 15 日率同仁前往責信訪視並於 9 月 21 日出席該校竣工儀式。</p> <p>4. 四川省雅安市寶興縣明禮鄉中心小學援建工程原訂 2015 年 12 月完工，惟因天候因素延宕工進，於 2016 年 1 月 28 日驗收完工。至此「512 汶川地震災後重建計畫」全案完成。</p> <p>5. 經費支出計新台幣 5,757 萬 1,854 元。</p>	

	綜合業務：- 行政費	執行專案業務行政費	100.00%	經費支出計新台幣 2,315 萬 2,407 元。
	綜合業務：募款必要成本	募款必要成本及責信業務之執行費用	100.00%	經費支出計新台幣 317 萬 701 元。
備註	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫之款項及衍生之利息收入均依計畫專戶儲存、專款專用。 2. 100 年 5 月 30 日第 19 屆第 10 次理事會議通過汶川地震災後重建計畫修正案，增列備災救災能量強化與推廣計畫。 3. 102 年 5 月 9 日第 20 屆第 4 次臨時理事會議通過，增列雅安賑災計畫：『緊急救援行動』及『災後復原重建』。 4. 截至 105 年 3 月 31 日止，汶川累計經費支出計新台幣 15 億 8,809 萬 5,365 元；雅安累計經費支出計新台幣 6,610 萬 9,755 元，專案總支出計新台幣 16 億 5,420 萬 5,120 元，占總經費 100.00%。 5. 本會預定於於 105 年 4 月 21 日，將「512 汶川地震災後重建計畫」結案報告，函送衛福部及內政部備查。 			



本會援建 43 所學校中，最早完工的成都市解放北路第一小學



成都市解放北路第一小學學生上課情形。重建後的校園提供完善且多元的教育環境



陝西省勉縣老道寺衛生院是本會援建 43 所衛生院之一，協助災後基層衛生系統的重建



本會辦理冬季棉被發放活動，家園雖毀，但滿滿的愛心仍希望讓災民能夠度個暖冬



本會王清峰會長(時任副會長)於 100 年訪視接受本會寒梅計畫助學金補助的學童們



本會補助設立之甘肅省西和縣社區與生活重建中心，於當地舉辦社區活動及婦女識字班




紅十字小餐盒關懷四川偏遠 8 個縣市的 49 個學校，2,400 位學生受益



四川省中峰鄉社區服務中心的圖書館是孩子課餘最愛報到的地方



提供甘肅省天水老人院營養早餐，是弱勢關懷其中一項

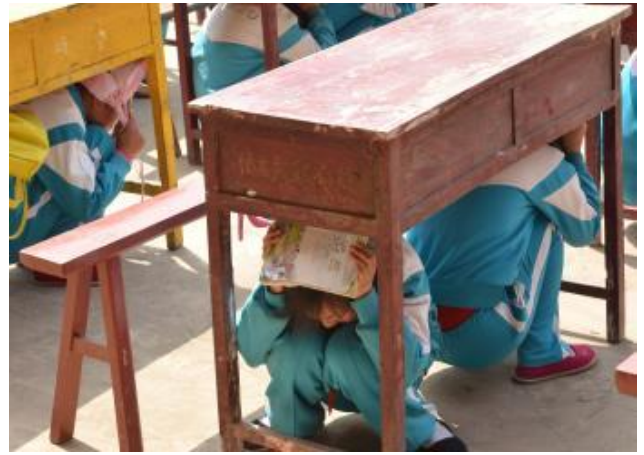

甘肅漳縣王馬咁村救備災能量推廣的防災演練是全村村民、學生一起來



西安雁塔區東儀社區推動急救訓練，讓災難來時可以自救救人



寶興縣明禮鄉中心小學示意說明圖



漢源縣九襄鎮第三小學示意圖



明禮鄉中心小學動土奠基儀式




九襄鎮第三小學災後重建紀念碑



本會借台灣營建研究院、大陸紅十字組織等相關單位，至明禮鄉中心小學現地勘查



九襄鎮第三小學教學樓主體外觀

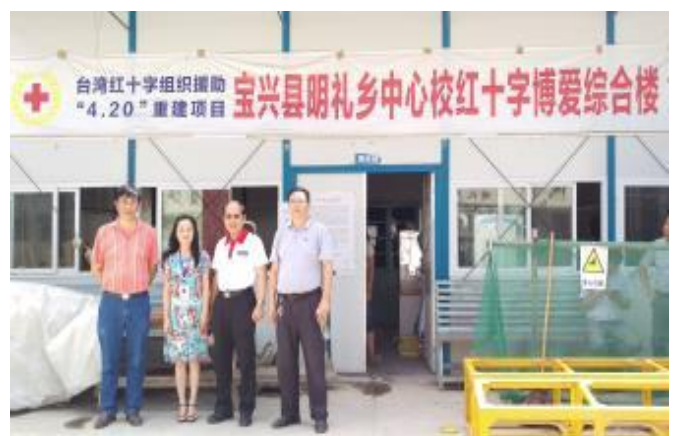

本會借同台灣營建研究院、大陸紅十字組織等相關單位，至明禮鄉中心小學現地勘查



九襄鎮第三小學運動場、大門及圍牆



明禮鄉中心小學主體結構完成



九襄鎮第三小學學生食堂



明禮鄉中心小學綜合樓



本會王清峰會長率同仁出席九襄鎮第三小學
竣工儀式



明禮鄉中心小學綜合樓



舉辦「高齡化社會紅十字會的角色與功能」圓桌會議



捐贈陝西勉縣衛生院 10 輛救護車暨車上救護設備
